

1. 측정결과 - 2021. 01. 20.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 12대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0012	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0010	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.97	245	0.0014	검출한계 미만
	#5	부지경계선5	9.95	245	0.0012	검출한계 미만
	#6	부지경계선6	9.93	245	0.0010	검출한계 미만
	#7	위생설비입구1	9.94	45	0.0040	미만
	#8	위생설비입구2	9.95	45	0.0037	미만
	#9	위생설비입구3	9.93	45	0.0044	미만
	#10	작업장주변1	9.91	125	0.0044	미만
	#11	작업장주변2	9.95	125	0.0035	미만
	#12	작업장주변3	9.97	125	0.0043	미만
	#13	음압기공기배출구1	9.91	45	0.0044	미만
	#14	음압기공기배출구2	9.93	45	0.0037	미만
	#15	음압기공기배출구3	9.93	45	0.0037	미만
	#16	폐기물반출구1	9.98	45	0.0044	미만
	#17	폐기물반출구2	9.96	45	0.0040	미만
	#18	폐기물반출구3	9.93	45	0.0040	미만
	#19	폐기물보관지점1	9.95	45	0.0040	미만
	#20	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0044	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2021. 01. 21.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 12대 SARA5100 / 6대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0014	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.95	245	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#5	부지경계선5	9.94	245	0.0010	검출한계 미만
	#6	부지경계선6	9.91	245	0.0012	검출한계 미만
	#7	위생설비입구1	9.92	45	0.0040	미만
	#8	위생설비입구2	9.96	45	0.0044	미만
	#9	위생설비입구3	9.91	45	0.0040	미만
	#10	작업장주변1	9.94	125	0.0039	미만
	#11	작업장주변2	9.92	125	0.0043	미만
	#12	작업장주변3	9.92	125	0.0047	미만
	#13	음압기공기배출구1	9.94	45	0.0037	미만
	#14	음압기공기배출구2	9.92	45	0.0040	미만
	#15	음압기공기배출구3	9.91	45	0.0037	미만
	#16	폐기물반출구1	9.93	45	0.0037	미만
	#17	폐기물반출구2	9.93	45	0.0040	미만
	#18	폐기물반출구3	9.93	45	0.0044	미만
	#19	폐기물보관지점1	9.91	45	0.0033	미만
	#20	폐기물보관지점2	9.93	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2021. 01. 22.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대 SARA5100 / 12대	#1	부지경계선1	9.92	245	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0014	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.97	245	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.95	245	0.0010	검출한계 미만
	#5	부지경계선5	9.91	245	0.0014	검출한계 미만
	#6	부지경계선6	9.96	245	0.0012	검출한계 미만
	#7	위생설비입구1	9.94	45	0.0040	미만
	#8	위생설비입구2	9.93	45	0.0044	미만
	#9	위생설비입구3	9.98	45	0.0036	미만
	#10	위생설비입구4	9.95	45	0.0040	미만
	#11	위생설비입구5	9.92	45	0.0044	미만
	#12	작업장주변1	9.90	125	0.0036	미만
	#13	작업장주변2	9.94	125	0.0039	미만
	#14	작업장주변3	9.91	125	0.0044	미만
	#15	작업장주변4	9.92	125	0.0047	미만
	#16	작업장주변5	9.94	125	0.0043	미만
	#17	음압기공기배출구1	9.96	45	0.0036	미만
	#18	음압기공기배출구2	9.94	45	0.0040	미만
	#19	음압기공기배출구3	9.94	45	0.0040	미만
	#20	음압기공기배출구4	9.94	45	0.0044	미만
	#21	음압기공기배출구5	9.96	45	0.0033	미만
	#22	폐기물반출구1	9.92	45	0.0037	미만
	#23	폐기물반출구2	9.95	45	0.0044	미만
	#24	폐기물반출구3	9.93	45	0.0040	미만
	#25	폐기물반출구4	9.91	45	0.0037	미만
	#26	폐기물반출구5	9.95	45	0.0044	미만
	#27	폐기물보관지점1	9.97	45	0.0044	미만
	#28	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0044	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정결과 - 2021. 01. 23.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA5100 / 11대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.95	245	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.96	245	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0014	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.95	45	0.0044	미만
	#6	작업장주변	9.94	125	0.0043	미만
	#7	음압기공기배출구	9.95	45	0.0037	미만
	#8	폐기물반출구	9.93	45	0.0037	미만
	#9	폐기물보관지점1	9.94	45	0.0044	미만
	#10	폐기물보관지점2	9.95	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

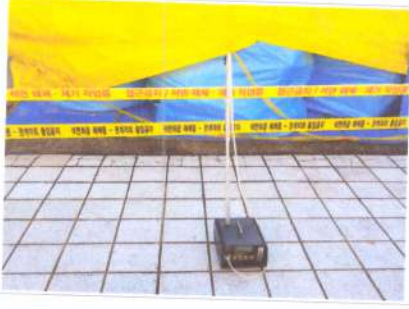
1. 측정결과 - 2021. 01. 24.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA5100 / 2대	#1	부지경계선1	9.96	45	0.0040	미만
	#2	부지경계선2	9.96	45	0.0044	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1			0.0040
	측정 시작 시간 09:50	측정 종료 시간 10:35	
폐기물보관 지점2			0.0044
	측정 시작 시간 09:52	측정 종료 시간 10:37	

1. 측정결과 - 2021. 01. 25.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	부지경계선1	9.94	45	0.0037	미만
	#2	부지경계선2	9.92	45	0.0044	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0037
	측정 시작 시간 09:55		측정 종료 시간 10:40	
폐기물보관 지점2				0.0044
	측정 시작 시간 09:56		측정 종료 시간 10:41	

1. 측정결과 - 2021. 01. 26.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 1대 SARA5100 / 1대	#1	부지경계선1	9.97	45	0.0040	미만
	#2	부지경계선2	9.93	45	0.0037	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 1대, SARA5100 / 1대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1			0.0040
	측정 시작 시간 10:01	측정 종료 시간 10:46	
폐기물보관 지점2			0.0037
	측정 시작 시간 10:02	측정 종료 시간 10:47	

1. 측정결과 - 2021. 01. 27.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	부지경계선1	9.91	45	0.0037	미만
	#2	부지경계선2	9.93	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0037
	측정 시작 시간 10:05		측정 종료 시간 10:50	
폐기물보관 지점2				0.0040
	측정 시작 시간 10:06		측정 종료 시간 10:51	

1. 측정결과 - 2021. 01. 28.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA5100 / 2대	#1	부지경계선1	9.94	45	0.0033	미만
	#2	부지경계선2	9.92	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA5100 / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0033
	측정 시작 시간 09:55		측정 종료 시간 10:40	
폐기물보관 지점2				0.0040
	측정 시작 시간 09:57		측정 종료 시간 10:42	

1. 측정결과 - 2021. 01. 29.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	부지경계선1	9.92	45	0.0040	미만
	#2	부지경계선2	9.94	45	0.0033	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1				0.0040
	측정 시작 시간 10:32		측정 종료 시간 11:17	
폐기물보관 지점2				0.0033
	측정 시작 시간 10:35		측정 종료 시간 11:20	

1. 측정결과 - 2021. 01. 30.

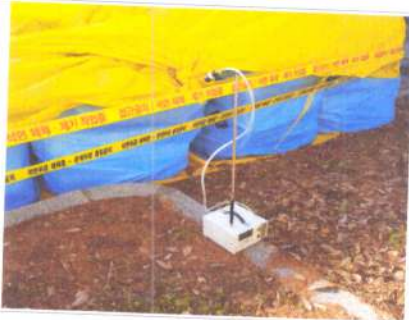
측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 1대 SARA5100 / 1대	#1	부지경계선1	9.96	45	0.0036	미만
	#2	부지경계선2	9.95	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 1대, SARA5100 / 1대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1			0.0036
	측정 시작 시간 10:27	측정 종료 시간 11:12	
폐기물보관 지점2			0.0040
	측정 시작 시간 10:29	측정 종료 시간 11:14	

1. 측정결과 - 2021. 01. 31.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	부지경계선1	9.96	45	0.0040	미만
	#2	부지경계선2	9.95	45	0.0033	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 2대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물보관 지점1			0.0040
	측정 시작 시간 10:41	측정 종료 시간 11:26	
폐기물보관 지점2			0.0033
	측정 시작 시간 10:43	측정 종료 시간 11:28	
