

시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (1) / (총 12) 측정 일자 : 2022. 10. 05.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석 일자 : 2022. 10. 05.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-1	부지경계선	wonSLab sampling pump	9.526	270	16.561	0.0025	-	미만
A-2	부지경계선	wonSLab sampling pump	9.512	270	24.204	0.0036	-	미만
A-3	부지경계선	wonSLab sampling pump	9.519	270	21.656	0.0032	-	미만
A-4	부지경계선	wonSLab sampling pump	9.523	270	26.752	0.0040	-	미만
A-5	위생설비	wonSLab sampling pump	9.524	60	6.369	0.0043	-	미만
A-8-1	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.517	50	6.794	0.0055	-	미만
A-8-2	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.521	50	3.397	0.0027	-	미만
A-8-3	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.508	50	4.246	0.0034	-	미만
A-8-4	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.518	50	5.520	0.0045	-	미만
A-8-5	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.521	50	3.822	0.0031	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

- 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 05일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (2) / (총 12)

측정 일자 : 2022. 10. 05.

의뢰자 : ㈜더이앤씨

분석 일자 : 2022. 10. 05.

주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-9	폐기물반출구	wonsLab sampling pump	9.522	50	7.643	0.0062	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 05일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (3) / (총 12) 측정 일자 : 2022. 10. 06.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석 일자 : 2022. 10. 06.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-1	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.523	270	28.025	0.0042	-	미만
A-2	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.521	270	20.382	0.0031	-	미만
A-3	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.514	270	22.930	0.0034	-	미만
A-4	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.515	270	15.287	0.0023	-	미만
A-5-1	위생설비	wonsLab sampling pump	9.514	50	7.219	0.0058	-	미만
A-5-2	위생설비	wonsLab sampling pump	9.528	50	3.397	0.0027	-	미만
A-8-1	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.519	50	4.246	0.0034	-	미만
A-8-2	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.512	50	5.096	0.0041	-	미만
A-8-3	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.527	50	5.520	0.0045	-	미만
A-8-4	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.516	50	3.822	0.0031	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

- 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 06일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (4) / (총 12)

측정 일자 : 2022. 10. 06.

회 자 : ㈜더이앤씨

분석 일자 : 2022. 10. 06.

주 소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-8-5	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.527	50	5.945	0.0048	-	미만
A-9-1	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.515	50	7.643	0.0062	-	미만
A-9-2	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.522	50	8.493	0.0069	-	미만
A-10-1	폐기물보관지점	wonSLab sampling pump	9.522	50	4.671	0.0038	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonSLab sampling pump	9.521	50	4.246	0.0034	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 06일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (5) / (총 12)

측정일자 : 2022. 10. 07.

의뢰자 : ㈜더이앤씨

분석일자 : 2022. 10. 07.

주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-1	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.523	270	30.573	0.0046	-	미만
A-2	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.519	270	24.204	0.0036	-	미만
A-3	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.518	270	34.395	0.0052	-	미만
A-4	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.517	270	17.834	0.0027	-	미만
A-5-1	위생설비	wonsLab sampling pump	9.524	50	3.397	0.0027	-	미만
A-5-2	위생설비	wonsLab sampling pump	9.515	50	2.548	0.0021	-	미만
A-5-3	위생설비	wonsLab sampling pump	9.523	50	1.699	0.0014	-	미만
A-5-4	위생설비	wonsLab sampling pump	9.518	50	6.369	0.0052	-	미만
A-8-1	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.520	50	4.671	0.0038	-	미만
A-8-2	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.526	50	2.548	0.0021	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 07일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (6) / (총 12) 측정 일자 : 2022. 10. 07.
 의뢰자 : (주)더이앤씨 분석 일자 : 2022. 10. 07.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-8-3	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.521	50	4.246	0.0034	-	미만
A-8-4	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.521	50	5.520	0.0045	-	미만
A-8-5	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.517	50	1.699	0.0014	-	미만
A-8-6	음압기공기배출구	wonSLab sampling pump	9.526	50	3.822	0.0031	-	미만
A-9-1	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.519	50	5.520	0.0045	-	미만
A-9-2	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.524	50	7.219	0.0058	-	미만
A-9-3	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.520	50	8.068	0.0065	-	미만
A-9-4	폐기물반출구	wonSLab sampling pump	9.528	50	6.369	0.0052	-	미만
A-10-1	폐기물보관지점	wonSLab sampling pump	9.525	50	3.822	0.0031	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonSLab sampling pump	9.527	50	2.548	0.0021	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 07일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (7) / (총 12)

측정 일자 : 2022. 10. 07.

의뢰자 : ㈜더이앤씨

분석 일자 : 2022. 10. 07.

주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-10-3	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.516	50	4.246	0.0034	-	미만
A-10-4	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.527	50	3.397	0.0027	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 07일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (8) / (총 12) 측정일자 : 2022. 10. 08.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석일자 : 2022. 10. 08.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-1	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.523	270	24.204	0.0036	-	미만
A-2	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.527	270	11.465	0.0017	-	미만
A-3	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.516	270	19.108	0.0029	-	미만
A-4	부지경계선	wonsLab sampling pump	9.519	270	11.465	0.0017	-	미만
A-5-1	위생설비	wonsLab sampling pump	9.524	50	2.972	0.0024	-	미만
A-5-2	위생설비	wonsLab sampling pump	9.512	50	2.548	0.0021	-	미만
A-7	작업장주변	wonsLab sampling pump	9.520	130	15.287	0.0048	-	미만
A-8-1	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.515	50	2.123	0.0017	-	미만
A-8-2	음압기공기배출구	wonsLab sampling pump	9.521	50	3.397	0.0027	-	미만
A-9-1	폐기물반출구	wonsLab sampling pump	9.525	50	7.219	0.0058	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 08일

(주) 알 파 석 면 연 구 소



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (9) / (총 12)

측정 일자 : 2022. 10. 08.

의뢰자 : ㈜더이앤씨

분석 일자 : 2022. 10. 08.

주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-9-2	폐기물반출구	wonsLab sampling pump	9.514	50	5.520	0.0045	-	미만
A-10-1	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.525	50	1.699	0.0014	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.519	50	2.972	0.0024	-	미만
A-10-3	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.523	50	2.123	0.0017	-	미만
A-10-4	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.516	50	4.246	0.0034	-	미만

** 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 08일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (10) / (총 12) 측정 일자 : 2022. 10. 09.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석 일자 : 2022. 10. 09.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
우천으로 인한 측정 취소								

★ 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 09일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (11) / (총 12) 측정 일자 : 2022. 10. 10.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석 일자 : 2022. 10. 10.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-10-1	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.520	50	-	-	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.522	50	-	-	-	미만
A-10-3	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.523	50	-	-	-	미만
A-10-4	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.519	50	0.425	0.0003	-	미만

★ 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

- 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 10일

(주) 알 파 석 면 연 구



시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052

페이지 (12) / (총 12)

측정 일자 : 2022. 10. 11.

회 자 : ㈜더이앤씨

분석 일자 : 2022. 10. 11.

주 소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-10-1	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.523	50	-	-	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.521	50	0.849	0.0007	-	미만
A-10-3	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.520	50	-	-	-	미만
A-10-4	폐기물보관지점	wonsLab sampling pump	9.517	50	0.425	0.0003	-	미만

★ 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

- 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
- 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
- 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 10월 11일

(주) 알 파 석 면 연 구



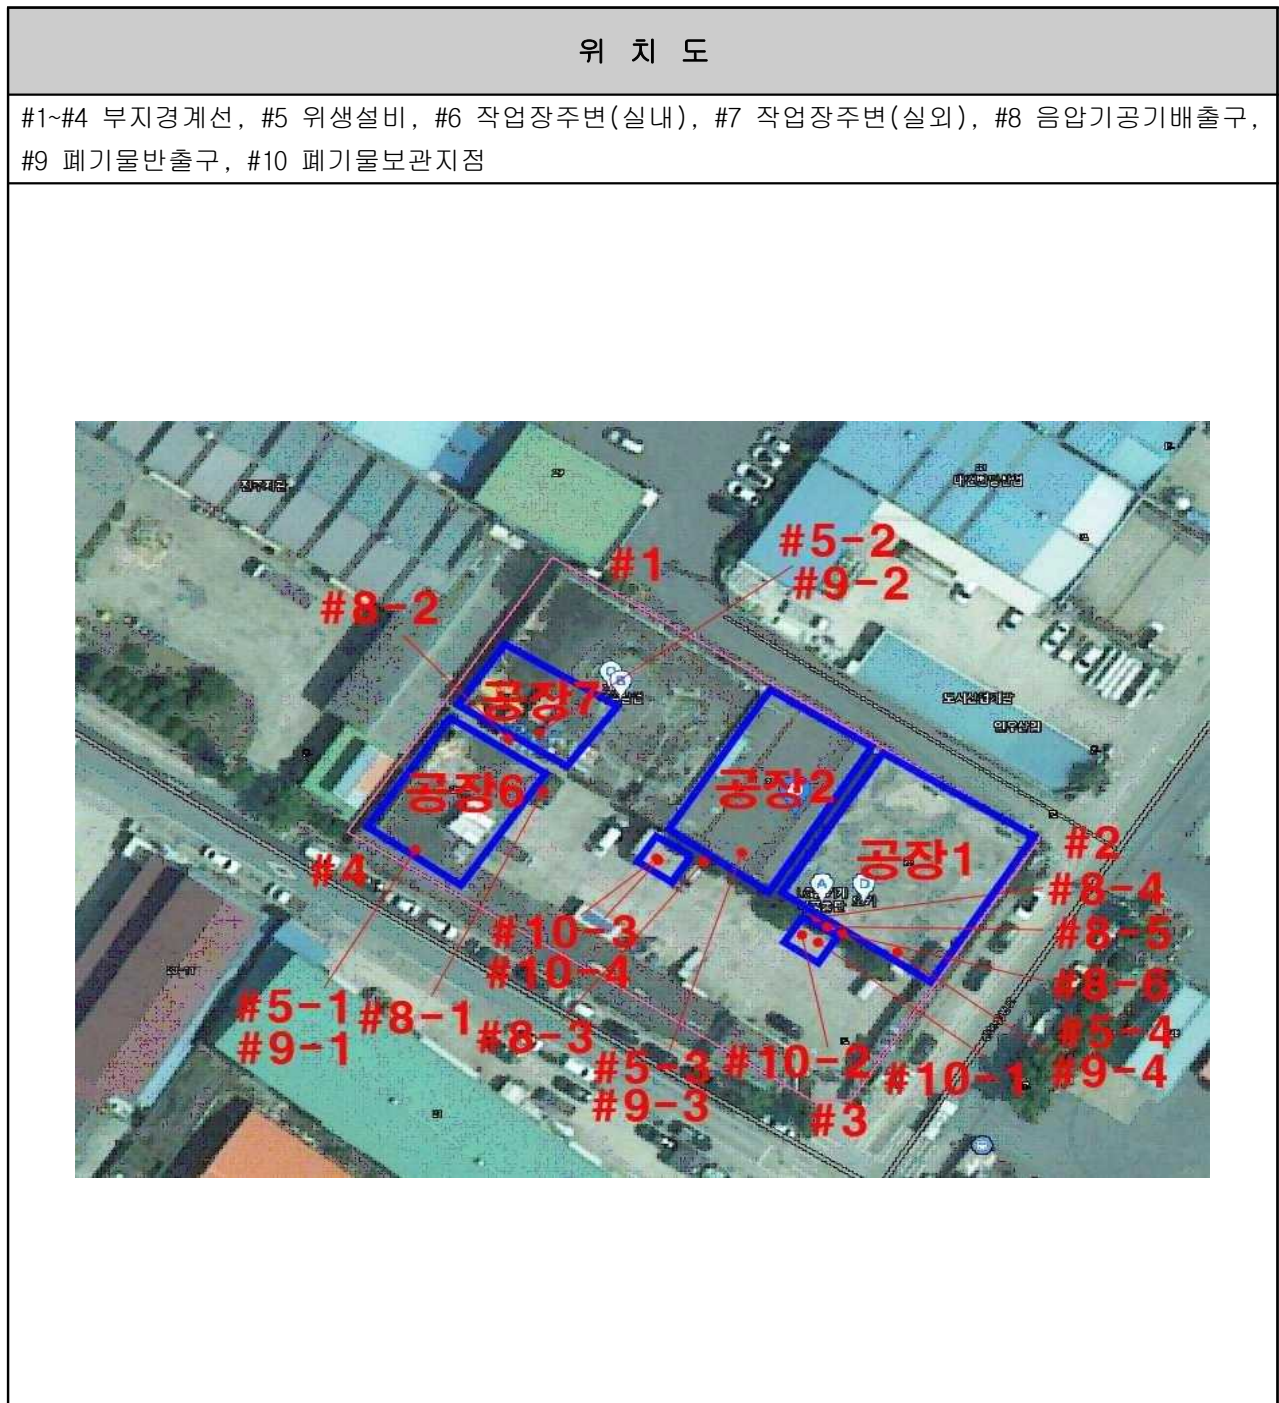
별첨 1-1. 측정 위치도(10월 05일, 공장1 2층)



별첨1-2. 측정 위치도(10월 06일, 공장7 2층/공장4 2층)



별첨1-3. 측정 위치도(10월 07일, 공장1 1층/공장2 1층/공장6 2층/공장7 1층)



별첨1-4. 측정 위치도

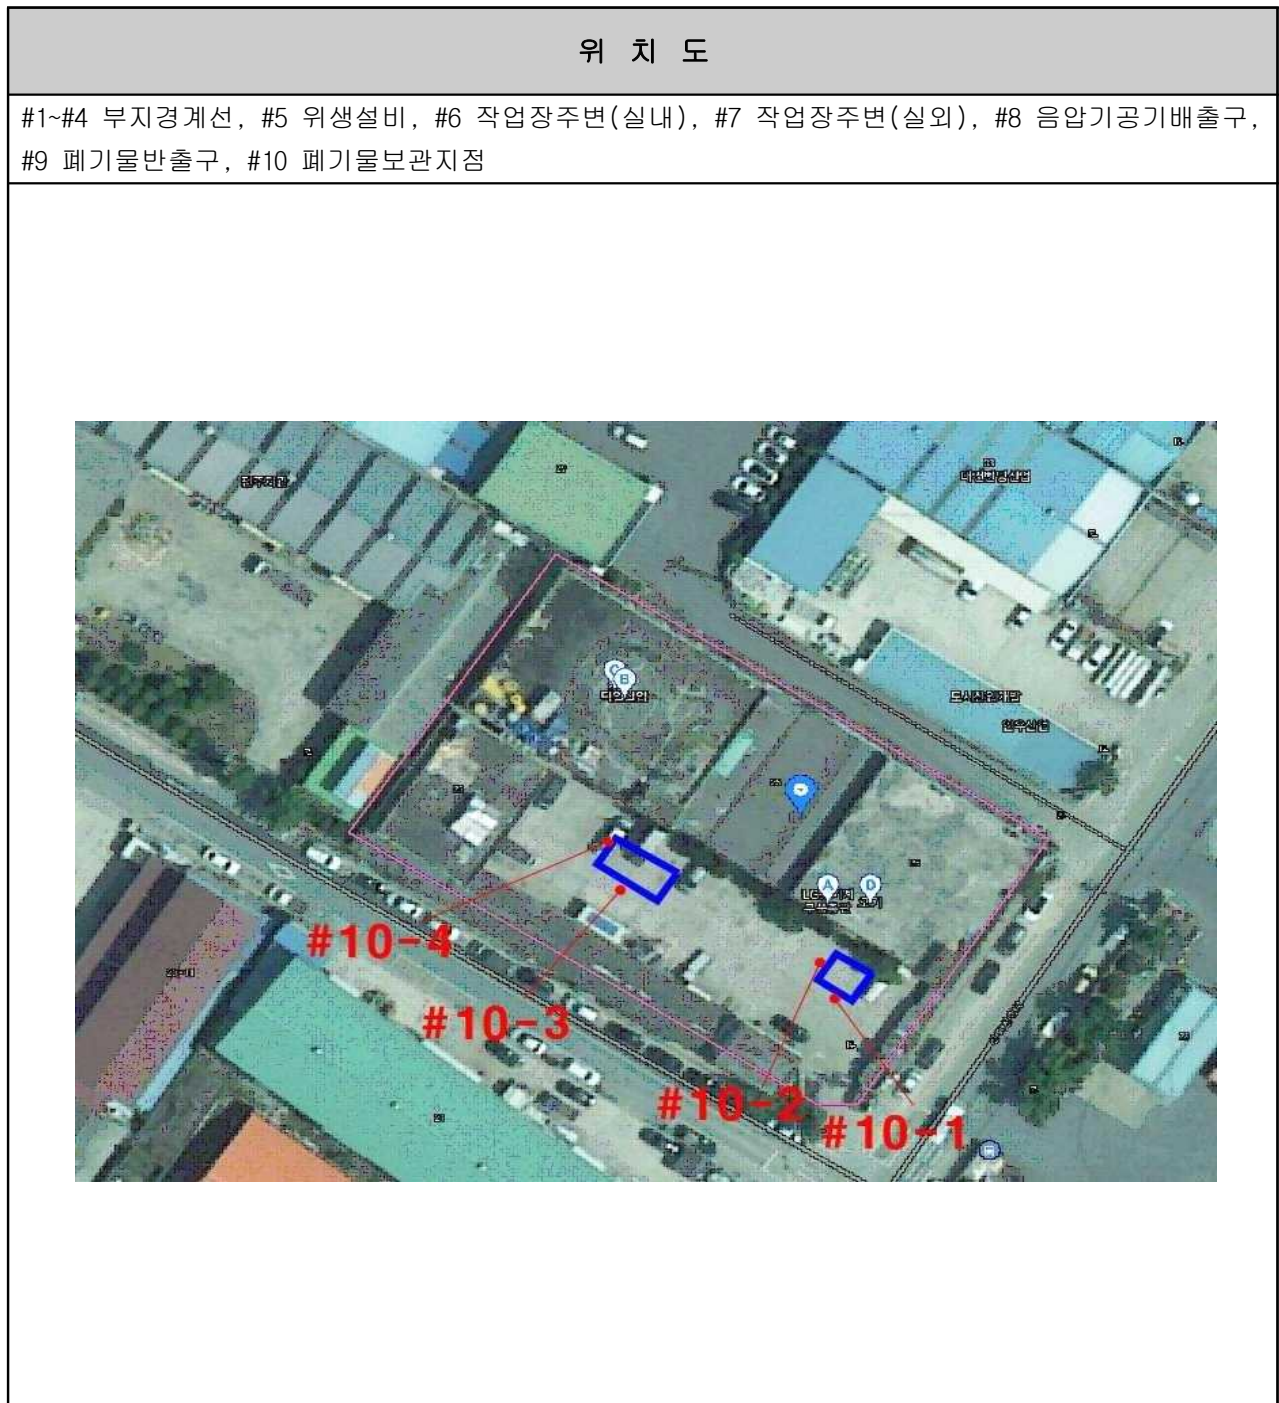
(10월 08일, 공장2 슬레이트(공장7 슬레이트 포함)/공장7 1층(화장실 제외))

위 치 도

#1~#4 부지경계선, #5 위생설비, #6 작업장주변(실내), #7 작업장주변(실외), #8 음압기공기배출구, #9 폐기물반출구, #10 폐기물보관지점



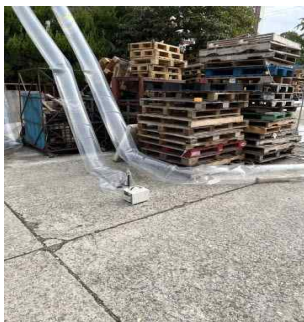
별첨1-5~6. 측정 위치도(10월 10일~11일, 폐기물보관지점)



별첨2-1. 측정 사진

측 정 사 진			
			
부지경계선1(전)		부지경계선1(후)	
시작	09:10	종료	13:40
			
부지경계선2(전)		부지경계선2(후)	
시작	09:12	종료	13:42
			
부지경계선3(전)		부지경계선3(후)	
시작	09:15	종료	13:45
			
부지경계선4(전)		부지경계선4(후)	
시작	09:17	종료	13:47
			
위생설비(전)		위생설비(후)	
시작	09:20	종료	10:20
			
음압기공기배출구1(전)		음압기공기배출구1(후)	
시작	09:25	종료	10:15
			
음압기공기배출구2(전)		음압기공기배출구2(후)	
시작	09:25	종료	10:15
			
음압기공기배출구3(전)		음압기공기배출구3(후)	
시작	09:25	종료	10:15

별첨2-1. 측정 사진

측 정 사 진							
							
음압기공기배출구4(전)		음압기공기배출구4(후)		음압기공기배출구5(전)		음압기공기배출구5(후)	
시작	09:25	종료	10:15	시작	09:25	종료	10:15
							
폐기물반출구(전)		폐기물반출구(후)					
시작	14:00	종료	14:50				

별첨2-2. 측정 사진

측 정 사 진			
			
부지경계선1(전)		부지경계선1(후)	
시작	08:35	종료	13:05
			
부지경계선2(전)		부지경계선2(후)	
시작	08:37	종료	13:07
			
부지경계선3(전)		부지경계선3(후)	
시작	08:39	종료	13:09
			
부지경계선4(전)		부지경계선4(후)	
시작	08:41	종료	13:11
			
위생설비1(전)		위생설비1(후)	
시작	08:45	종료	09:35
			
위생설비2(전)		위생설비2(후)	
시작	08:48	종료	09:38
			
음압기공기배출구1(전)		음압기공기배출구1(후)	
시작	08:52	종료	09:42
			
음압기공기배출구2(전)		음압기공기배출구2(후)	
시작	08:52	종료	09:42

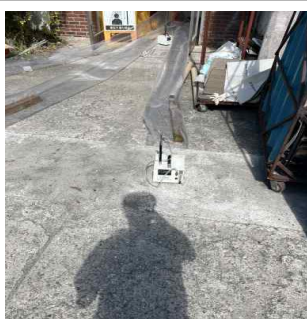
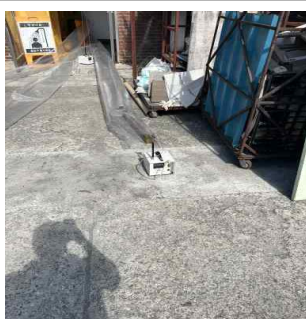
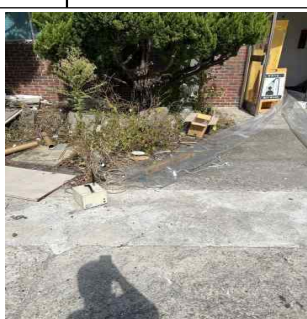
별첨2-2. 측정 사진

측 정 사 진			
			
음압기공기배출구3(전)		음압기공기배출구3(후)	
시작	08:52	종료	09:42
			
음압기공기배출구5(전)		폐기물반출구1(전)	
시작	08:54	종료	09:44
			
폐기물반출구2(전)		폐기물보관지점1(전)	
시작	13:13	종료	14:03
			
폐기물보관지점2(전)			
시작	09:00	종료	09:50

별첨2-3. 측정 사진

측 정 사 진							
							
부지경계선1(전)		부지경계선1(후)		부지경계선2(전)		부지경계선2(후)	
시작	08:20	종료	12:50	시작	08:22	종료	12:52
							
부지경계선3(전)		부지경계선3(후)		부지경계선4(전)		부지경계선4(후)	
시작	08:25	종료	12:55	시작	08:27	종료	12:57
							
위생설비1(전)		위생설비1(후)		위생설비2(전)		위생설비2(후)	
시작	08:30	종료	09:20	시작	08:35	종료	09:25
							
위생설비3(전)		위생설비3(후)		위생설비4(전)		위생설비4(후)	
시작	08:40	종료	09:30	시작	08:43	종료	09:33

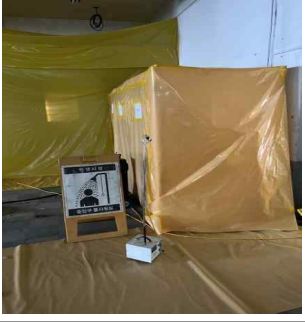
별첨2-3. 측정 사진

측 정 사 진							
							
음압기공기배출구1(전)		음압기공기배출구1(후)		음압기공기배출구2(전)		음압기공기배출구2(후)	
시작	08:33	종료	09:23	시작	08:36	종료	09:26
							
음압기공기배출구3(전)		음압기공기배출구3(후)		음압기공기배출구4(전)		음압기공기배출구4(후)	
시작	08:42	종료	09:32	시작	08:45	종료	09:35
							
음압기공기배출구5(전)		음압기공기배출구5(후)		음압기공기배출구6(전)		음압기공기배출구6(후)	
시작	08:45	종료	09:35	시작	08:45	종료	09:35
							
폐기물반출구1(전)		폐기물반출구1(후)		폐기물반출구2(전)		폐기물반출구2(후)	
시작	09:50	종료	10:40	시작	09:30	종료	10:20

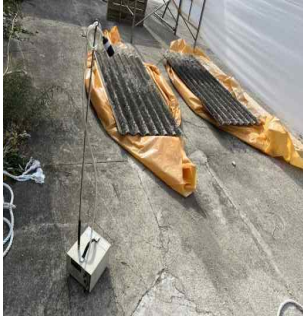
별첨2-3. 측정 사진

측 정 사 진							
							
폐기물반출구3(전)		폐기물반출구3(후)		폐기물반출구4(전)		폐기물반출구4(후)	
시작	10:00	종료	10:50	시작	13:00	종료	13:50
							
폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)		폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)	
시작	09:00	종료	09:50	시작	09:00	종료	09:50
							
폐기물보관지점3(전)		폐기물보관지점3(후)		폐기물보관지점4(전)		폐기물보관지점4(후)	
시작	09:00	종료	09:50	시작	09:00	종료	09:50

별첨2-4. 측정 사진

측 정 사 진							
							
부지경계선1(전)		부지경계선1(후)		부지경계선2(전)		부지경계선2(후)	
시작	08:32	종료	13:02	시작	08:34	종료	13:04
							
부지경계선3(전)		부지경계선3(후)		부지경계선4(전)		부지경계선4(후)	
시작	08:37	종료	13:07	시작	08:39	종료	13:09
							
위생설비1(전)		위생설비1(후)		위생설비2(전)		위생설비2(후)	
시작	08:45	종료	09:35	시작	08:47	종료	09:37
							
작업장주변(전)		작업장주변(후)		음압기공기배출구1(전)		음압기공기배출구1(후)	
시작	08:50	종료	11:00	시작	08:55	종료	09:45

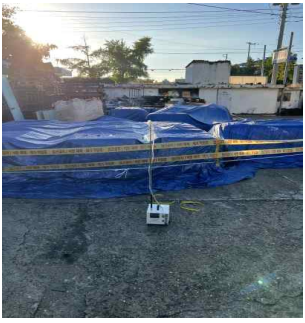
별첨2-4. 측정 사진

측 정 사 진							
							
음압기공기배출구2(전)		음압기공기배출구2(후)		폐기물반출구1(전)		폐기물반출구1(후)	
시작	08:56	종료	09:46	시작	10:10	종료	11:00
							
폐기물반출구2(전)		폐기물반출구2(후)		폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)	
시작	10:12	종료	11:02	시작	09:00	종료	09:50
							
폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)		폐기물보관지점3(전)		폐기물보관지점3(후)	
시작	09:00	종료	09:50	시작	09:00	종료	09:50
							
폐기물보관지점4(전)		폐기물보관지점4(후)					
시작	09:00	종료	09:50				

별첨2-5. 측정 사진

측 정 사 진							
							
폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)		폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)	
시작	09:00	종료	09:50	시작	09:00	종료	09:50
							
폐기물보관지점3(전)		폐기물보관지점3(후)		폐기물보관지점4(전)		폐기물보관지점4(후)	
시작	09:00	종료	09:50	시작	09:00	종료	09:50

별첨2-6. 측정 사진

측 정 사 진							
							
폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)		폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)	
시작	07:30	종료	08:20	시작	07:30	종료	08:20
							
폐기물보관지점3(전)		폐기물보관지점3(후)		폐기물보관지점4(전)		폐기물보관지점4(후)	
시작	07:30	종료	08:20	시작	07:30	종료	08:20
